
计划、实际与预测对照

截至 2026-10-28

事项 / 状态 / 进度口径	2026-10-01	2026-10-12	2026-10-23	2026-11-03	2026-11-14	完成日期 / 较原计划
范围与接口确认 产品 · 已完成 100% · 五项检查项均已确认						**实际 2026-10-06** +1 自然日
系统联调 交付 · 受阻 60% · 12/20项约定用例通过；不是时间经过比例						**预计 2026-11-03** +15 自然日 预测仍依赖外部接口环境及支持人落实
业务验收 业务 · 未开始						**预计 2026-11-10** +11 自然日 验收窗口仍需业务确认

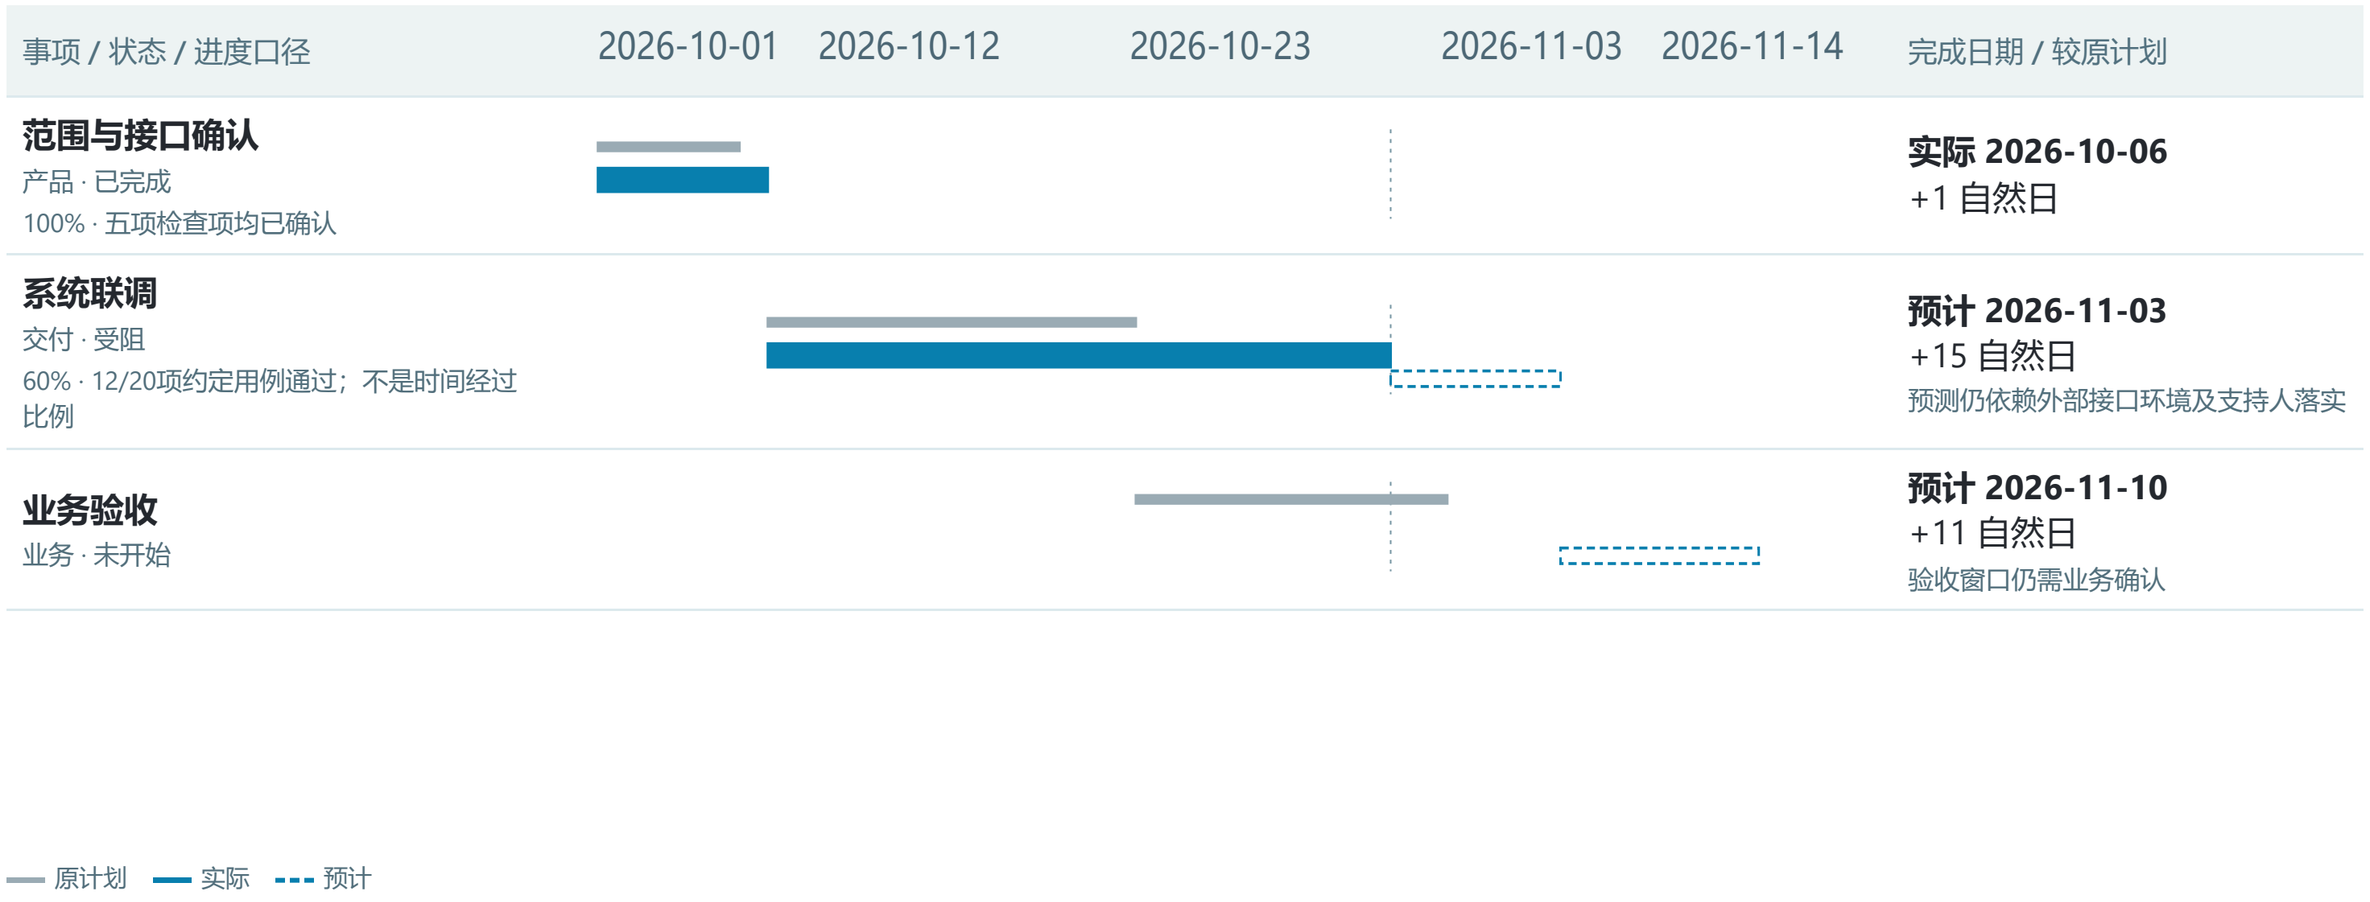

交付结果与验收状态

截至 2026-10-28

事项	结果、标准与范围	执行	验收
范围与接口确认	**五项检查已确认** 标准: 范围及五项接口检查完成 范围: 范围与接口文档，不代表项目整体验收	已完成	已接受
系统联调	**12项通过，8项待处理** 标准: 约定联调用例通过 范围: 联调范围	受阻	待审核
业务验收	**未知** 标准: 核心业务流程按标准验证 范围: 业务交付范围	未开始	未提交

本页资料 · 计划、实际与预测对照

1. synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态
2. synthetic-schedule@1 · baseline
3. synthetic-schedule@1 · tasks.requirements
4. synthetic-schedule@1 · checks
5. synthetic-schedule@1 · tasks.integration
6. synthetic-schedule@1 · cases
7. synthetic-schedule@1 · tasks.business

排期口径

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1

范围与接口确认 · 日期明细

基线: 2026-10-01 → 2026-10-05 · 实际: 2026-10-01 → 2026-10-06 · 预计: 未知 → 未知

系统联调 · 日期明细

基线: 2026-10-07 → 2026-10-19 · 实际: 2026-10-07 → 未知 · 预计: 未知 → 2026-11-03

业务验收 · 日期明细

基线: 2026-10-20 → 2026-10-30 · 实际: 未知 → 未知 · 预计: 2026-11-04 → 2026-11-10

图例说明

经过区间不等于工作量；点仅表示已知日期。

计划、实际与预测对照

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

本页资料 · 交付结果与验收状态

1. synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态
2. synthetic-schedule@1 · baseline
3. synthetic-schedule@1 · tasks.requirements
4. synthetic-schedule@1 · acceptance.requirements
5. synthetic-schedule@1 · tasks.integration
6. synthetic-schedule@1 · acceptance.integration
7. synthetic-schedule@1 · tasks.business

排期口径

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1

交付结果与验收状态

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。
