项目进度与需要支持的事项（1/2）

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1 [2]

摘要选取 3/3 · 覆盖当前三个工作包及试点节点，保留受阻事项与验收条件

关键节点选取 1/1

事项 / 节点	状态	当前日期 / 偏差	关键条件
范围与接口确认 [3] 产品	已完成	2026-10-06 +1 自然日	未知
系统联调 [4] 交付	受阻	2026-11-03 +15 自然日	预测仍依赖外部接口环境及支持人落实
业务验收 [5] 业务	未开始	2026-11-10 +11 自然日	验收窗口仍需业务确认

- 确认接口环境及支持人 [6] 协调负责人 · 2026-10-30
- 确认业务验收窗口 [7] 业务负责人 · 2026-11-02

[1]

范围与限制 • 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

来源与详情 [1]

备查 / Backup:

项目进度与需要支持的事项（2/2）

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1 [2]

摘要选取 3/3 · 覆盖当前三个工作包及试点节点，保留受阻事项与验收条件

关键节点选取 1/1

事项 / 节点	状态	当前日期 / 偏差	关键条件
试点上线 [3]	当前预测	2026-11-13 +5 自然日	需先完成联调与业务验收

[1]

范围与限制


- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

来源与详情 [1]

备查 / Backup:

计划、实际与预测对照

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1 [2]

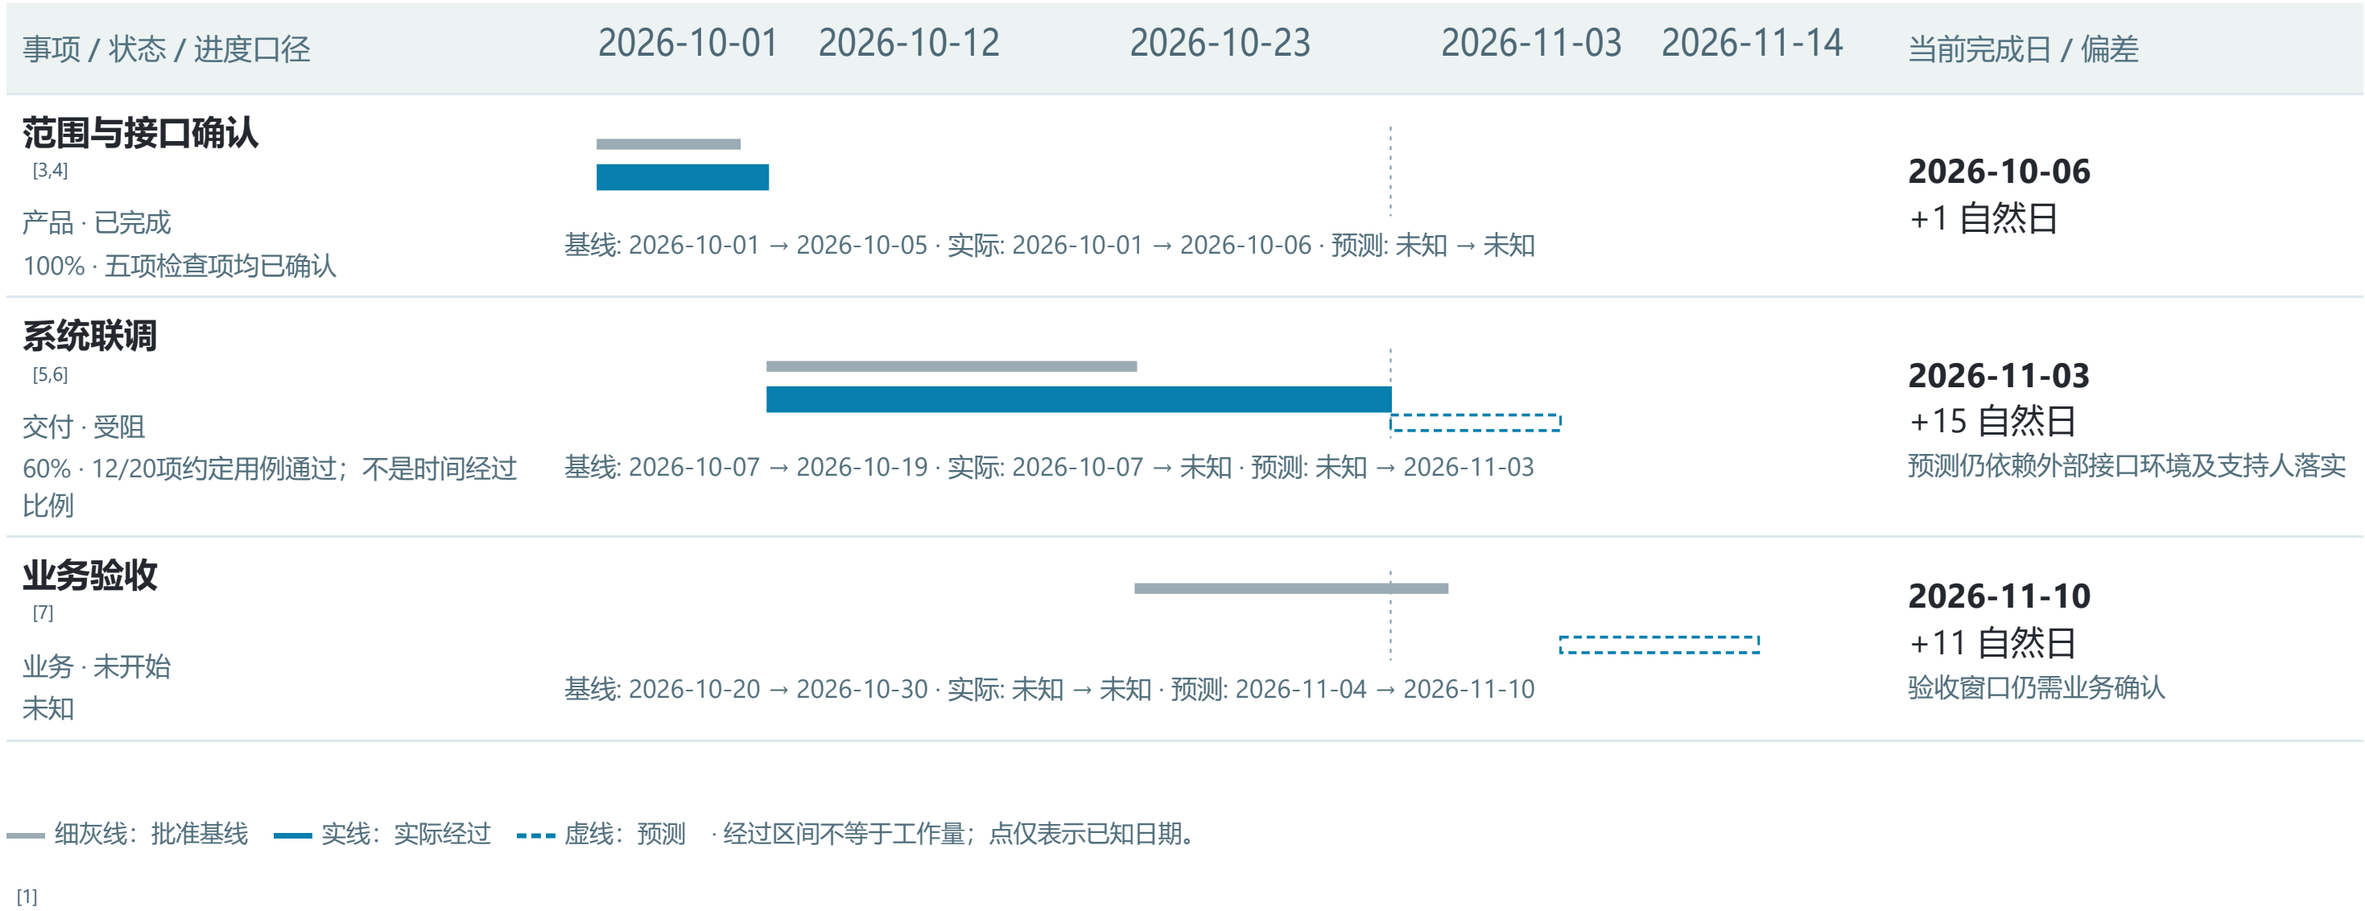

[1]

范围与限制


- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

来源与详情 [1]

备查 / Backup:

里程碑日期对照

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1 [2]



灰色实心菱形：批准基线；蓝色实心菱形：已经发生；蓝色空心虚线菱形：当前预测。

[1]

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

来源与详情 [1]

备查 / Backup:

交付结果与验收状态

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1 [2]

事项	结果、标准与范围	执行	验收
范围与接口确认 [3,4]	**五项检查已确认** 标准: 范围及五项接口检查完成 范围: 范围与接口文档，不代表项目整体验收	已完成	已接受
系统联调 [5,6]	**12项通过，8项待处理** 标准: 约定联调用例通过 范围: 联调范围	受阻	待审核
业务验收 [7]	**未知** 标准: 核心业务流程按标准验证 范围: 业务交付范围	未开始	未提交

[1]

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。


来源与详情 [1]

备查 / Backup:

同一基线下的历史预测变化

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1 [2]

试点上线 · 基线日期: 2026-11-08 [3]

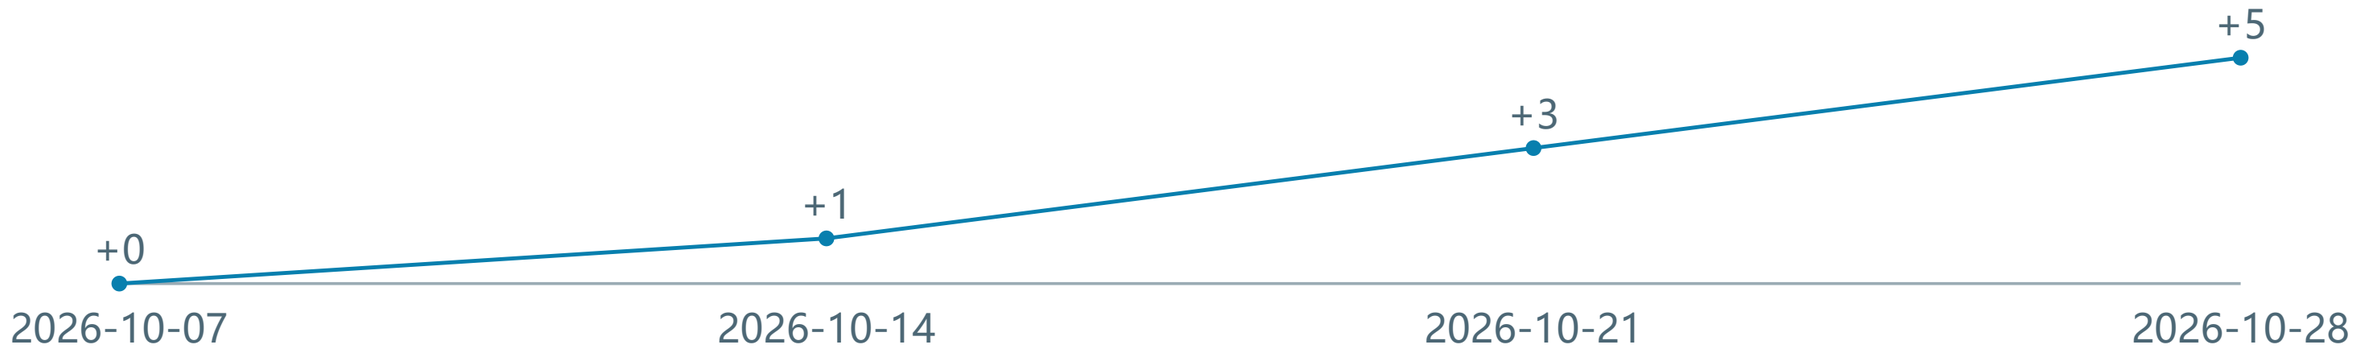

报告日	当时预测	相对基线
2026-10-07	2026-11-08 [4]	+0 自然日
2026-10-14	2026-11-09 [5]	+1 自然日
2026-10-21	2026-11-11 [6]	+3 自然日
2026-10-28	2026-11-13 [7]	+5 自然日

横轴：实际报告日期；纵轴：相对上述基线的自然日偏差。两点仅表示一次变化，不表示完成率或日期可信度。

[1]

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

来源与详情 [1]

备查 / Backup:

来源与详情 · 项目进度与需要支持的事项（1/2）

1. synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态
2. synthetic-schedule@1 · baseline
3. synthetic-schedule@1 · tasks.requirements
4. synthetic-schedule@1 · tasks.integration
5. synthetic-schedule@1 · tasks.business
6. synthetic-schedule@1 · actions.support
7. synthetic-schedule@1 · actions.window

来源与详情 · 项目进度与需要支持的事项（2/2）

1. synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态
2. synthetic-schedule@1 · baseline
3. synthetic-schedule@1 · milestones.launch

来源与详情 · 计划、实际与预测对照

1. synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态
2. synthetic-schedule@1 · baseline
3. synthetic-schedule@1 · tasks.requirements
4. synthetic-schedule@1 · checks
5. synthetic-schedule@1 · tasks.integration
6. synthetic-schedule@1 · cases

7. synthetic-schedule@1 · tasks.business

来源与详情 · 里程碑日期对照

1. synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态
2. synthetic-schedule@1 · baseline
3. synthetic-schedule@1 · milestones.launch

来源与详情 · 交付结果与验收状态

1. synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态
2. synthetic-schedule@1 · baseline
3. synthetic-schedule@1 · tasks.requirements
4. synthetic-schedule@1 · acceptance.requirements
5. synthetic-schedule@1 · tasks.integration
6. synthetic-schedule@1 · acceptance.integration
7. synthetic-schedule@1 · tasks.business

来源与详情 · 同一基线下的历史预测变化

1. synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态
2. synthetic-schedule@1 · baseline
3. synthetic-schedule@1 · milestones.launch
4. synthetic-schedule@1 · snapshot.1007
5. synthetic-schedule@1 · snapshot.1014

6. synthetic-schedule@1 · snapshot.1021

7. synthetic-schedule@1 · snapshot.1028
